

ALE COMBUSTÍVEIS · DIRETORIA DE OPERAÇÕES

Update Plano Diretor de Infraestrutura


Novos Negócios
Novas Ideias
Coragem

EVOLUÍDO

NOVO


EM HOLDING

Maio / 2026 · Confidencial · Reunião com CEO

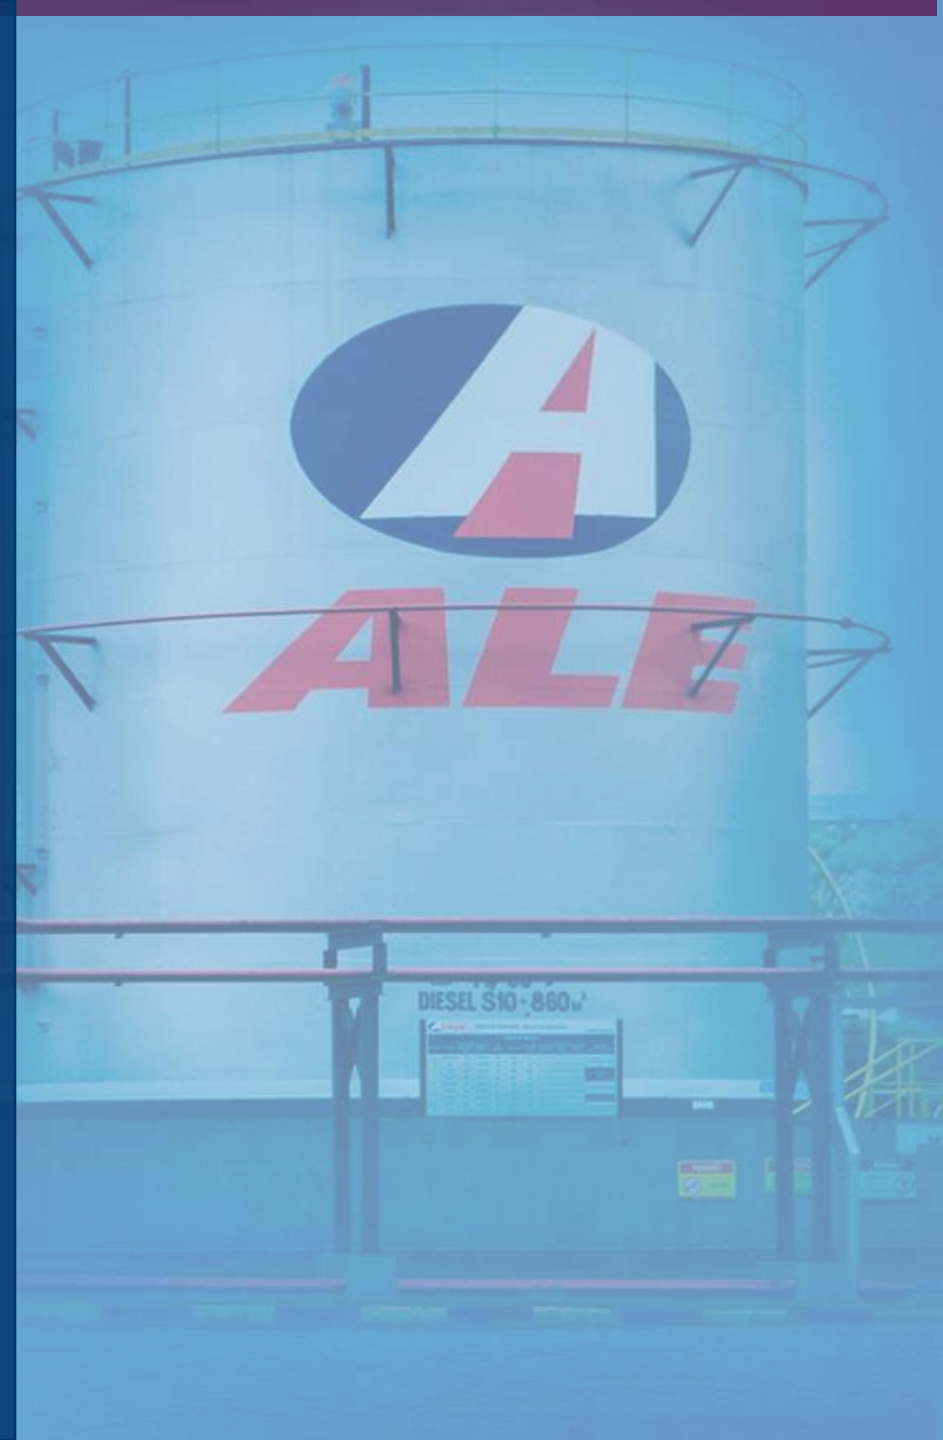

Mapa estratégico e gargalos de infraestrutura

MENSAGEM-CHAVE O crescimento comercial depende de infraestrutura disponível nas praças certas. Este mapa é a régua: onde a cor é azul escuro, qualquer gargalo logístico vira custo estratégico. Bandeiras vermelhas em três frentes: alto custo no N/NE, capacidade restrita em praças prioritárias e dependência de operador único. Mapa calibrado pelo Plano de Expansão Comercial.

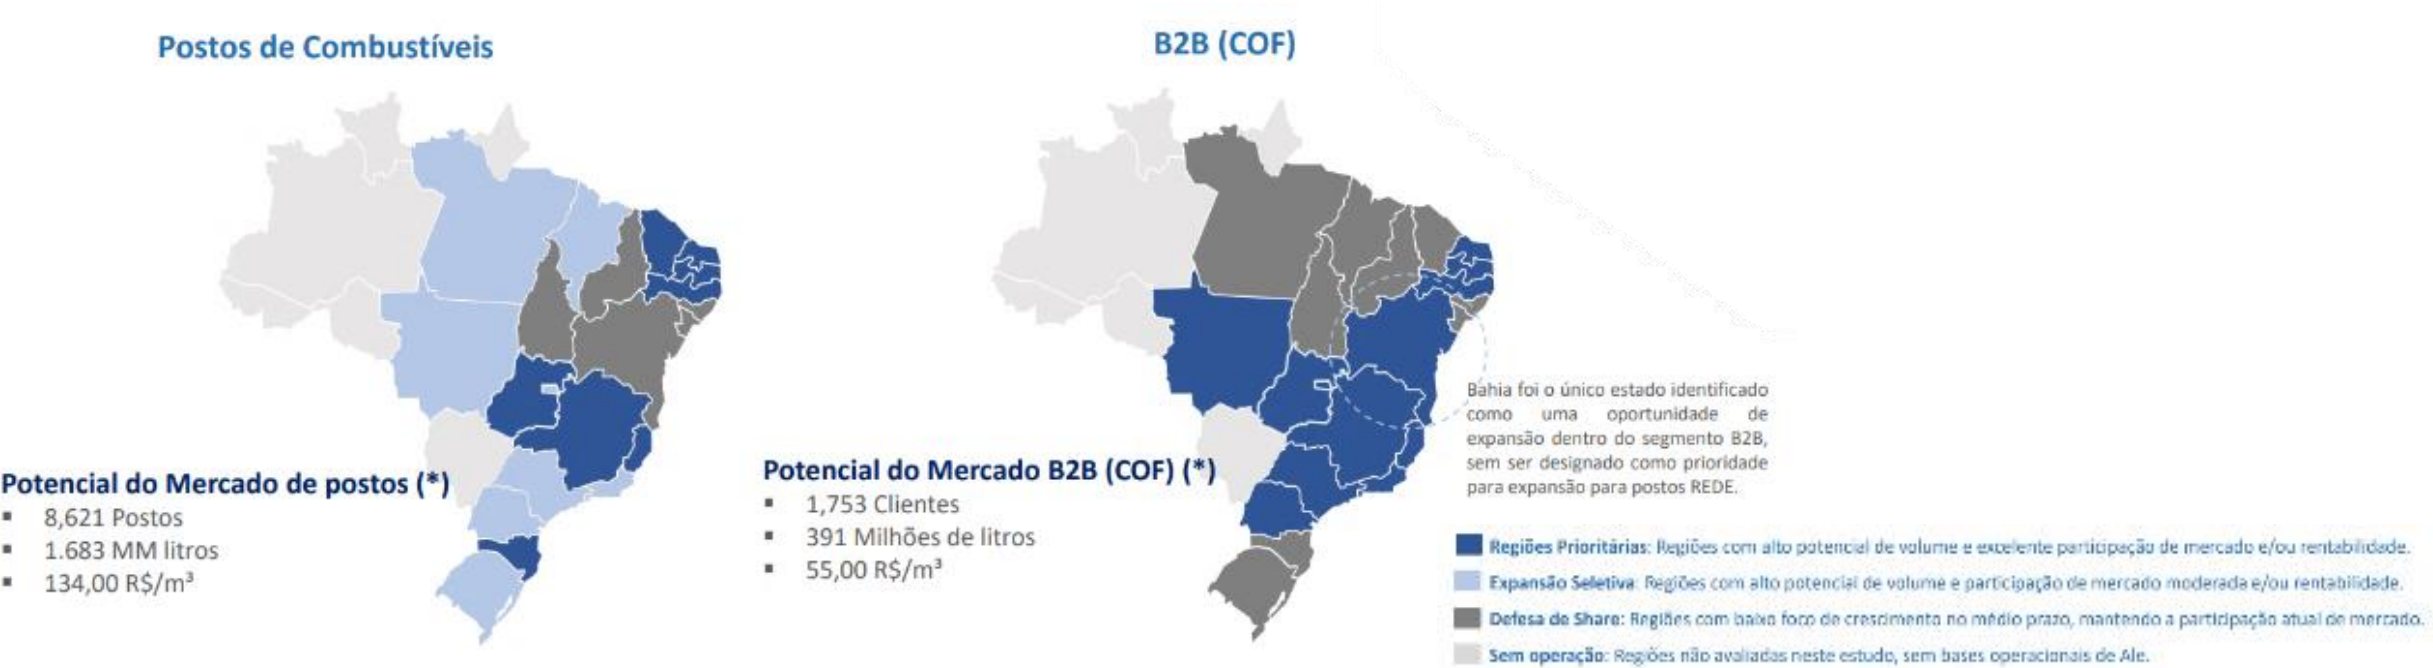

TIPOLOGIA DE GARGALO

Eixo	Filiais (operador)	Plano	Natureza
Alto custo unitário	Crato (Vibra) · Belém (Vibra+IPP) · Fortaleza (Vibra) · Maceió (Vibra)	A/C	Tarifa acima da média; mercado concentrado
Capacidade restrita	Goiânia (própria ALE) · OPASC-SC: Itajaí/Biguaçu/Guaramirim (RDP+Transpetro)	A	Base insuficiente vs. ambição de volume
Operador único	Crato (Vibra) · Vitória (Oiltank) - Teresina (Grane	A	Sem BATNA; tarifa extraída pelo monopolista
Take-or-Pay crônico	Belém (IPP 4.625 m³) · Montes Claros (IPP) · Porto Nacional (Granel)	B/C	Vol. contratado >> movimentação real
Defesa com risco	Teresina (Granel) · São Luís (Granel/Tequimar) · Porto Nacional (Granel)	B	Volume ok; custo a otimizar

Categorias Plano de Expansão
A = Regiões Prioritárias
B = Defesa de Share
C = Expansão Seletiva
D = Sem foco

Direcionamento estratégico e gargalos

MENSAGEM-CHAVE O plano de expansão Brasil evidencia uma ambição comercial relevante, mas sua captura depende da disponibilidade efetiva de infraestrutura logística nas regiões críticas. A análise compara volume projetado, potencial disponível e realidade operacional para identificar onde a operação sustenta o crescimento e onde há gargalos que exigem ação prévia.

Regiões Prioritárias						Expansão Seletiva						Defesa de Share					
Região	Cap. m³	Demanda 26 (m³)	Status 26 (m³)	Demanda 30 (m³)	Status 30 (m³)	Região	Cap. m³	Demanda 26 (m³)	Status 26 (m³)	Demanda 30 (m³)	Status 30 (m³)	Região	Cap. m³	Demanda 26 (m³)	Status 26 (m³)	Demanda 30 (m³)	Status 30 (m³)
BETIM	90,0	76,4	▶	91,2	▶	DUQUE DE CAXIAS	63,2	26,2	▶	34,8	▶	LEM	2,3	2,7	▶	2,9	▶
GOIANIA	61,3	14,3	▶	19,2	▶	GUARULHOS	62,7	21,2	▶	32,9	▶	SAO FCO DO CONDE	8,7	2,8	▶	3,0	▶
GUAMARE	50,1	9,7	▶	13,2	▶	S J RIO PRETO	18,9	3,7	▶	4,2	▶	PORTO NACIONAL	10,6	1,9	▶	2,1	▶
PAULINIA POOL *	40,1	11,8	▶	13,9	▶	BRASILIA	14,0	4,8	▶	5,3	▶	TERESINA	8,6	4,4	▶	4,9	▶
IPOJUCA	14,0	9,6	▶	14,2	▶	SAO LUIS	20,3	15,9	▶	16,2	▶	MACEIO	0,9	0,8	▶	0,8	▶
VITORIA	7,0	7,9	▶	10,2	▶	BELEM	3,9	5,0	▶	5,9	▶	ITABUNA	0,9	0,2	▶	0,2	▶
CABEDELO	6,5	7,3	▶	9,5	▶	ARAUCARIA	10,2	3,8	▶	5,6	▶	JEQUIE	1,0	0,2	▶	0,2	▶
ITAJAI	6,5	7,0	▶	9,3	▶	CANOAS	15,5	5,6	▶	8,8	▶						
FORTALEZA	3,7	5,4	▶	7,6	▶	RONDONOPOLIS	8,4	4,3	▶	4,8	▶						
RIO VERDE	4,2	2,0	▶	2,3	▶	ACAILANDIA	4,8	5,1	▶	6,8	▶						
MONTES CLAROS	4,6	2,1	▶	2,2	▶	CUBATAO	5,7	4,2	▶	4,8	▶						
CRATO	3,9	0,8	▶	0,8	▶	S J DOS CAMPOS	5,6	2,0	▶	2,5	▶						
GOV VAL	4,2	2,8	▶	2,8	▶	RIBEIRAO PRETO	6,7	2,0	▶	2,2	▶						
UBERLANDIA	1,7	2,0	▶	2,1	▶	CUIABA	2,3	0,8	▶	0,8	▶						
UBERABA	1,2	0,3	▶	0,4	▶	OURINHOS	3,1	1,4	▶	1,6	▶						
BIGUACU	1,4	3,0	▶	2,8	▶	SAO CAETANO	3,0	1,7	▶	2,0	▶						
GUARAMIRIM	1,4	0,4	▶	0,3	▶	RIO GRANDE *	5,4	0,5	▶	0,6	▶						
LAGES *	7,2	2,5	▶	2,4	▶												

Garantir infraestrutura competitiva nos mercados certos. As regiões em amarelo e vermelho indicam onde o crescimento depende de negociação, expansão, cessão de espaço ou solução estrutural antes da execução comercial.

Resumo do status — onde cada projeto está hoje

Comparativo com a última reunião · 21 frentes em curso

12 evoluíram · 4 em holding · 5 novos desde a última reunião

EVOLUÍDO12	NOVO5	EM HOLDING4
Phase Out Rio Grande Fechado Phase Out Uberaba Fase final Phase Out Bahia-Democráticas Análise comercial p/ comunicar clientes Goiânia – Nexta Modelo 50/50 acordado Açailândia / LEM Escrituração em curso Caxias / EFEN Termo de Ajuste fechado Belém + Cubatão + Betim Em minuta contratual OPASC Biguaçu Bombeio estabilizado Vitória – SPE 3 majors NDA em fase de assinatura Chapecó – Maxissul Análise comercial do volume São Luís – Granel (renovação) BID concluído · alçada Conselho Pecém – DISLUB Proposta recebida · NDA assinado	Saída Torrão → OPLA (opção) BID em curso Itajaí — Grupo Ávila + Stang Greenfield e bloqueio compliance Santa Maria — Rede SIM Pendente avaliação comercial Vitória — Otamérica Renegociação na mesa Suape — Ultracargo (renovação) BID concluído · alçada Conselho	Pool Paulínia — re-rateio Sem evolução Pool Paulínia — Proposta 2 IPP declinou no momento SJRP — Pool de 3 IPP condicionou a Guarulhos Vitória – Atlântica Sem avanço

Coragem & Novos Negócios · Phase Outs em execução e Goiânia avança no modelo de operação

Três frentes com avanço desde a última reunião (Drenagem evitada do conjunto Phase Out (4 bases): R\$10,4MM em 10 anos)

Evoluído		
Phase Out Rio Grande	Phase Out Uberaba	Phase Out Bahia-Democráticas
Status anterior: <i>Aprovado por logística e financeiro · alçada CEO</i> Status atual: Fechado Operação encerrada conforme planejado. Não havia carteira ativa relevante para migração — margem negativa estrutural justificava a saída imediata. Custos one-off já dimensionados no NPV anterior. Próximo passo: Encerramento administrativo e descomissionamento em andamento.	Status anterior: <i>Aprovado por logística e financeiro · alçada CEO</i> Status atual: Em fase final de phase out Migração de carteira para Uberlândia (60km) em curso. Volume sendo absorvido sem impacto operacional relevante. Permite descomissionamento da estrutura local. Manteremos a operação administrativa para alavancar cota Petrobras. Próximo passo: Conclusão do phase out e desmobilização dos contratos remanescentes.	Status anterior: <i>Em análise de impacto</i> Status atual: Em fase de análise comercial para comunicar clientes Decisão composta sobre qual base baiana manter (Jequié × Itabuna) avança para a fase de comunicação. A análise comercial em curso prepara a comunicação a clientes e a estruturação operacional para conclusão do phase-out. Próximo passo: Conclusão da análise comercial · comunicação a clientes · execução do phase-out.

Novos Negócios & Novas Ideias · Açailândia, Caxias e Belém-Cubatão-Betim avançam para instrumentos contratuais

Três frentes na fase de minuta, escrituração ou termo de ajuste

EVOLUÍDO

AÇAILÂNDIA / LEM

Status anterior: Swap concluído · execução prevista até 1ª quinzena de junho/26

Status atual: Em fase de troca de documentações e escrituração do terreno

Cronograma original (ANP em maio) foi ajustado pela complexidade documental. A formalização ANP só avança após a finalização da troca de documentações e da escrituração do terreno.

Próximo passo: Conclusão da escrituração e protocolo ANP.

CAXIAS — EFEN

Status anterior: Em fase de instrumentos contratuais · closing previsto ago/26

Status atual: Termo de Ajuste fechado · pendente contrato comercial

Avançamos com a assinatura do Termo de Ajuste do pool. O contrato comercial de compra e venda do produto que será operado na base ainda está em fase final de discussão.

Valores mantidos: venda de 6,4% por R\$8MM · NPV 10A R\$12,6MM (WACC 15%).

Próximo passo: Fechamento do contrato comercial e protocolo no CADE.

BELÉM + CUBATÃO + BETIM

Status anterior: Aprovado pela Ipiranga · pendente aprovação interna ALE

Status atual: Aprovado internamente · em fase de minuta contratual

Aprovação interna ALE concluída. Bundling com Ipiranga em fase de redação das minutas contratuais para as três praças.

Economia mantida: -R\$3,8MM até dez/27 (-31%) · Belém tarifa de R\$105,73 → R\$52,87 · Cubatão R\$80,31 → R\$45,00 · Betim entra como nova contratação.

Próximo passo: Conclusão das minutas e assinatura dos contratos.

Novos Negócios, Novas Ideias & Coragem · Vitória SPE, Chapecó e Phase Out Bahia avançam

Três frentes que saíram de holding com evolução material no período

EVOLUÍDO

VITÓRIA — SPE

Status anterior: Em discussão de NDA

Status atual: NDA em fase de assinatura

Conversa com SPE Vibra + Raízen + IPP evoluiu da discussão para a redação final do NDA. A assinatura abre formalmente a fase de discussão do contrato futuro de armazenagem no terminal a ser construído. Start operacional do terminal previsto para 2028.

Próximo passo: Assinatura do NDA e início da discussão do contrato futuro.

CHAPECÓ — MAXISSUL

Status anterior: Tarifa e volume mínimo levantados

Status atual: Em análise comercial do volume

Cessão de espaço na base Maxissul em Chapecó com tarifa e volume mínimo já definidos. A análise comercial está em curso para validar o volume que justifique a economicidade da entrada.

SC é classificada como praça prioritária no Plano de Expansão (projeção de demanda · share 3,7% · 788 postos no target).

Próximo passo: Conclusão da análise comercial e decisão sobre fechamento da cessão.

GOIÂNIA — NEXTA

Status anterior: NDA assinado · fase inicial de estudo de cenários

Status atual: Modelo 50/50 acordado · falta definir modelo de negócio

Avançamos com a negociação para um modelo de operação 50% para cada parte. A premissa de compartilhamento de OPEX e CAPEX está acordada — o que falta é o desenho do modelo contratual (sociedade, operação conjunta, cessão recíproca).

Decisão sobre o modelo de negócio depende de renegociação do contrato de arrendamento atual, que por sua vez depende de aceite do locador.

Próximo passo: Estruturação do modelo de negócio e abertura de tratativa com locador.

Novas Ideias · OPASC Biguaçu — retorno do tanque de anidro estabilizou os bombeios

Operação SC normalizada após restrição da Transpetro

EM VALIDAÇÃO DE MINUTAS

O que estava em curso

A operação SC enfrentava restrição severa de descarga de Anidro em Biguaçu pela Transpetro a partir de abril/2026. O polo OPASC (Biguaçu + Itajaí + Guaramirim) responde por 81% do volume de gasolina do estado — a restrição comprometia os bombeios e forçava transferência crescente para Itajaí.

O que mudou

Tanque de anidro retornou à operação

O tanque que estava fora de operação pela Transpetro voltou ao serviço, aliviando a restrição. A situação dos bombeios ficou estável.

Próximos passos e conexão com Itajaí

Minutas com novos espaços, já considerando o novo cenário de bombeio, em fase de validação.

Conexão estrutural: a solução de longo prazo para o polo OPASC continua sendo Itajaí (greenfield com Grupo Ávila ou outra possibilidade). Itajaí absorverá a projeção de demanda que Biguaçu não pode sustentar e permitirá recebimento de importado, removendo a dependência exclusiva do duto.

A estabilização atual é operacional, não estrutural. O risco de nova restrição na Transpetro permanece — o que reforça a urgência do greenfield Itajaí como solução definitiva para o polo OPASC.

Novos Negócios · Pecém — proposta DISLUB recebida e NDA assinado abrem avaliação de viabilidade

CE = praça prioritária no Plano de Expansão (projeção de demanda) · greenfield com início Jul/27 · concessão 25 anos

Terminal marítimo greenfield em construção no Porto de Pecém. 170.000 m³ de tancagem total, área para ampliação, modais rodoviário + Cabotagem (possibilidade futura de ferroviário). DISLUB enviou proposta comercial em abril/26 e NDA está assinado. ALE agora inicia a avaliação de viabilidade.

Proposta DISLUB — produtos, espaços e giros

Produto	Estático (m³)	Giros	ToP (m³)
Diesel S10	1.000	2,00	2.000
Gasolina	1.500	2,00	3.000
Anidro	300	4,00	1.200
Hidratado	300	4,00	1.200
Biodiesel	150	4,00	600
TOTAL	3.500	2,29	8.000

Condições comerciais

Preço
R\$ 78,00 / m³
(líquido · + PIS/COFINS/ISS · data-base jan/26 · reajuste IPCA)

Custo mensal ToP
R\$ 624 K / mês
(R\$ 7,5 MM / ano · base sem reajuste)

Prazo
10 anos (Jul/27 → Jul/37)
ToP compensável entre produtos.

Pecém abre dupla janela: alternativa à entrada por Fortaleza (CE) e alternativa de suprimento para a região hoje abastecida via Ipojuca (PE) e Cabedelo (PB). Avaliação de viabilidade vai dimensionar o impacto nas duas frentes simultaneamente.

Novas Ideias · São Luís — situação atual: tarifa efetiva R\$58,65/m³ com Santos + Ultracargo

Contrato Ultracargo vence Jun/26 · MA classificada como Expansão Seletiva na projeção de demanda do Plano de Expansão

ALE opera hoje em São Luís com dois cedentes: Santos Brasil (cedente principal, multa de saída R\$10MM — mantida) e Ultracargo (Tequimar, contrato vence Jun/26). O BID foi conduzido para substituir o slot da Ultracargo.

Distribuição de armazenagem atual

Cedente	Estática (m³)	Tarifa 1º giro (R\$)	Tarifa 2º giro (R\$)	Status
Santos Brasil	5.850	75,00	28,00	Mantido (multa R\$10MM)
Ultracargo	7.700	72,16	21,20	Vence Jun/26
TOTAL	13.550	Tarifa efetiva	R\$ 58,65	ToP 13.550

Quanto pagamos hoje

Tarifa efetiva
R\$ 58,65 / m³

Contrato mensal all-in
R\$ 606 K / mês

Anualizado
R\$ 7,3 MM / ano

BID conduzido entre Granel e Ultracargo. Santos Brasil mantida fora do BID por restrição contratual (multa R\$10MM). Resultado: Granel vence pelo combo conjunto São Luís + Porto Nacional + Teresina — proposta individual Granel ficou atrás de Santos isolado (R\$51,14), mas o desconto cruzado nas três praças supera o cenário Santos isolado em ~R\$1,4MM/ano.

Novas Ideias · São Luís — proposta Granel reduz tarifa em 8,5% e captura combo SL + PN + Teresina

Recomendação: aceitar Granel · valor total contrato 36 meses R\$ 18,5MM

Atual x proposta Granel — comparativo detalhado

Indicador	Atual (Santos + Ultra)	Proposta Granel	Δ
Tarifa 1º giro (R\$/m³)	72,16	66,00	-9%
Tarifa 2º giro (R\$/m³)	21,20	33,00	+56%
Tarifa efetiva (R\$/m³)	58,65	53,67	-8,5%
Estática (m³)	7.700	7.700	=
ToP (m³)	7.700	10.395	+35%
Contrato mensal all-in (R\$)	606 K	513 K	-15%

Valor total do contrato (36 meses)

R\$ 18,5 MM

Economia projetada vs cenário atual: ~R\$ 1,1 MM/ano · R\$ 3,3 MM em 3 anos

Por que Granel — não Santos isolado

Santos individual seria mais barato (R\$51,14), mas o desconto Granel está condicionado ao fechamento do combo São Luís + Porto Nacional + Teresina. Combo consolidado vale +R\$1,4MM/ano vs cenário Santos isolado.

Novas Ideias · saída forçada da Torrão converte-se em oportunidade

— BID OPLA em curso

A perda de espaço por arrendamento da Nexta abre caminho para alternativa ferroviária + importado

O que aconteceu

A base da Torrão — terminal utilizado pela ALE para descargas de importado — foi arrendada pela Nexta. Com isso, ALE foi convidada a se retirar do espaço.

Não era movimento planejado. Mas a saída forçada abriu a janela para revisar a logística do importado em Paulínia com critério estratégico, não apenas operacional.

Solução desenhada: OPLA (Grupo Ultra)

BID em curso. OPLA é a melhor opção identificada porque resolve três pontos de uma vez: oferece alternativa ferroviária ao Pool de Paulínia, permite descarga de importado, e abre rota de envio de importado para Rondonópolis, Cuiabá e Rio Verde. Além de abrir possibilidade para descarga ferroviária de biocombustíveis em Paulínia.

Três benefícios estratégicos do OPLA

1

Alternativa ferroviária

Reduz dependência do Pool de Paulínia (frente em holding) — ferrovia disponível independentemente do andamento do re-rateio.

2

Descarga de importado

Restaura a capacidade de descarregar produto importado que foi perdida com a saída da Torrão.

3

Rota para o Centro-Oeste

Abre canal de envio de importado para Rondonópolis, Cuiabá e Rio Verde — abre possibilidade de frete retorno de biocombustíveis.

Efeito colateral relevante: a operação OPLA passa a ser a BATNA real do Pool de Paulínia. Independente do andamento do re-rateio, ALE terá ferrovia operando — o que muda o poder de barganha nas conversas com as condôminas.

Novas Ideias · OPLA — atenção operacional com janela de 2 meses sem tanque de Gasolina

Risco operacional mapeado · alternativa-ponte necessária

Restrição identificada

O tanque de Gasolina da OPLA só inicia operação em 2 meses. Durante essa janela, a alternativa para descarga de Gasolina importada via OPLA estará indisponível.

Não é impeditivo da migração estratégica — já que o GAP de Paulínia encontra-se no S10.

O que está sob controle

- Cronograma do BID de Paulínia segue normalmente para os demais produtos.
- Operação ferroviária via OPLA não depende do tanque de Gasolina.
- Rota Rondonópolis / Cuiabá / Rio Verde via OPLA pode iniciar com outros produtos.

O que precisa de ação

- Solução-ponte para Gasolina A é Ruff e ipiranga.
- Acompanhar cronograma OPLA da habilitação do tanque para não estender a janela.

Próximo passo: Concluir o BID com outros Playres em Paulínia e realizar análise se OPLA realmente é a melhor solução.

Novos Negócios · Itajaí avança como macro-objetivo — Grupo Ávila aparece como primeira possibilidade concreta

Greenfield em SC continua sendo o objetivo · uma possibilidade, não a única

Greenfield em Itajaí continua sendo o macro-objetivo estratégico — solução estrutural para o polo OPASC e para a captura do potencial de SC. Neste momento, surgiu a possibilidade de avanço com o Grupo Ávila (Rede Galo), mas não deve ser a única alternativa em análise.

Configuração projetada

Movimentação alvo

15.000 m³ / mês

Parque de tancagem

1.500 m³

Modal — 1ª fase

100% rodoviário · com possibilidade de interligação com duto

Status atual e próximos passos

Conversas evoluindo com o Grupo Ávila.

Próximo marco: agenda das engenharias marcada para a 1ª quinzena de junho para avaliação técnica do projeto.

Importante registrar: Grupo Ávila é a primeira possibilidade concreta, não a única. ALE mantém o macro-objetivo aberto a outras alternativas que possam surgir.

Itajaí é a solução estrutural de longo prazo para o polo OPASC. Estabilização operacional em Biguaçu (slide anterior) não substitui a necessidade do greenfield.

Novos Negócios · Itajaí — Stang é a única alternativa de armazenagem com escala e importado no polo OPASC

SC opera em 14.294 m³/mês — já supera projeção de demanda 2026 e está a 3,5% da projeção 2030

O problema operacional em SC

Polo OPASC (Biguaçu + Itajaí + Guaramirim) responde por 81% do volume de gasolina do estado. Biguaçu transfere parte significativa da demanda para Itajaí, que se torna ponto único de falha do sistema. O modelo Biguaçu-média + Itajaí-picos exige redimensionar a tancagem de Gasolina A em Itajaí de 200 m³ atuais para 406 m³. Não há solução operacional disponível na infraestrutura ALE atual.

Alternativas avaliadas em Itajaí — apenas Stang reúne os 3 atributos críticos

Atributo	Stang	RDP (atual)	Transpetro	Greenfield
Escala disponível	22.065 m³ (406 = 1,8%)	Saturada	Não	Não imediata
Recebe importado	Sim — via Paranaguá	Não (cut-off densidade)	Apenas Petrobras	Possível
Prazo de ativação	Imediato (após destrave)	—	—	18–24 meses
Modelo comercial	Cessão de espaço	Cessão atual saturada	Democrática	Próprio / pool

Stang reúne escala (22.065 m³ — 406 são apenas 1,8% do terminal), perfil de produto (recebe importado), e disponibilidade contratual. Caso técnico construído.

Novos Negócios · Stang permanece bloqueada em compliance — caso técnico mantido como referência de planejamento

Parecer Glencore reiterado em jan/2026 · sem autonomia local · destrave depende de decisão judicial externa

Status do bloqueio compliance

Três análises de compliance · todas submetidas à Glencore · todas com parecer de não negociação.

Último parecer: abril de 2026

Reiterou os pareceres de 2024 (Glencore + Jurídico interno ALE).

Motivos do bloqueio:

Ações judiciais em curso sobre fraudes em licitações, manipulação de preços, pagamento de propinas a agentes públicos e corrupção.

Condição para destrave:

Decisão de mérito das ações judiciais. Sem evolução desde 2024.

Compliance local não tem autonomia para alterar a recomendação.

Plano de ação em três frentes

1. Manter caso técnico

406 m³ aprovados como referência oficial de planejamento — premissa do Plano Diretor com revisão anual. Sem decisão de execução vinculada.

2. Monitoramento jurídico ativo

Rotina trimestral de acompanhamento das ações judiciais. Gatilhos pré-definidos para reabertura: decisão favorável, mudança de controle societário, ou fato relevante.

3. Acelerar alternativas estruturais

Grupo Ávila / Rede Galo · brownfield · greenfield · Chapecó como captura geográfica adicional. Não dependem da Stang.

Posição ALE: este update não propõe contestar o bloqueio. Mantém o dimensionamento dos 406 m³ como referência de planejamento e acelera as alternativas estruturais em paralelo. A Stang fica como opcionalidade caso o cenário judicial evolua.

Novos Negócios · Santa Maria — possibilidade com SIM em base nova abre presença ALE no Rio Grande do Sul

PENDENTE AVALIAÇÃO COMERCIAL

Rede SIM aparece como parceira recorrente — Goiânia (Nexta) + Santa Maria

Phase-in via armazenagem em base nova da Rede SIM. RS é classificado como praça de crescimento inorgânico na projeção de demanda do Plano de Expansão — a entrada via terceiro com armazenagem dedicada é o caminho mais rápido e de menor CAPEX para presença no estado.

Estrutura do deal

Tipo

Phase-in via cessão de armazenagem

Contraparte

Rede SIM (mesma do projeto Goiânia–Nexta)

Praça

Santa Maria · RS · base nova da contraparte

Aderência ao Plano Comercial

RS classificado como **crescimento inorgânico** no Plano de Expansão.

Phase-in via cessão é um caminho possível.

Padrão emergente — Rede SIM

Rede SIM aparece em duas frentes do plano:

- **Goiânia–Nexta**
- **Santa Maria–phase-in**

Torna-se parceira recorrente em pontos onde a ALE precisa de capilaridade.

Próximo passo: avaliação comercial em curso para validar possibilidade da entrada · sem decisão estrutural pendente neste momento.

Novas Ideias · Suape — Ultracargo única alternativa viável em mercado saturado, redução de 18%

PE classificado como prioritário na projeção de demanda do Plano de Expansão · contrato Tequimar vence Jul/26

Posição atual ALE em Suape

Cedente	Estática	Tarifa 1º (R\$)	Função / Status
Ultracargo	3.600 m³	49,89	Vencimento em Jul/26
Temape	3.420 m³	56,13	Vencimento em Jan/28
Vol. médio movimentado	~6.300 m³/mês	Tar. ef.	R\$ 53,71

Estrutura do BID — saturação

4 operadores consultados:

- Temape — sem disponibilidade
- Decal — sem disponibilidade
- Pandenor — sem disponibilidade
- Ultracargo — **única proposta**

Mercado de Suape com indicação de saturação.
Início da Operação do PECEM pode roubar volume de Ipojuca.

Proposta Ultracargo — Opção 1 (recomendada)

Indicador	Atual	Op. 1 (ToP Fixo)	Δ
Tarifa 1º giro (R\$/m³)	78,89	65,00	-18%
Tarifa 2º giro (R\$/m³)	39,45	39,00	-1%
ToP (m³)	3.600	3.600	=

Recomendação · Op. 1

Valor base contrato 36 meses

R\$ 8,4 MM

Com sobre-giro projetado

~R\$ 12,2 MM

Op. 2 (ToP variável) só vence em cenário de queda estrutural de volume — não é o caso.

Novas Ideias · Vitória opera no limite da grade contratada — gap se amplia até 2030

ES = praça prioritária no Plano de Expansão (projeção de demanda)

Posição cativa em Vitória: operador único (Otamérica/Oiltank), contrato vigente até 2029, sem alternativa física no ES no curto prazo. Discussão é sobre grade de carregamento (slot diário de saída), não sobre tancagem.

Grade contratada vs demanda real (m³/dia)

Produto	Grade contrato	Média 2026	Gap médio	Gap em pico
GASC (61% mix)	150	191	-41	-269
S10B	75	63	+12	-89
S500B	75	52	+23	-70
EHC	15	17	-2	-33
TOTAL	315	323	-8	—

Projeção 2026 → 2030

Volume médio (m³/mês)

7.516 → 10.200 (+36%)

Demanda média (m³/dia) em 2030

340 vs grade de 315

Gap em pico (2030)

-365 m³/dia

(estrutural · sem grade pública não atende)

O atendimento acima dos 315 m³/dia depende de grade pública — volumes que outras distribuidoras não utilizam e liberam. Correlação perversa: a grade pública seca justamente em períodos de pico de mercado. Em pico, a demanda diária dobra (ou mais) em relação à média. Operação subsidiada pela ineficiência de concorrentes — modelo insustentável por desenho, falha quando o mercado está aquecido.

Novas Ideias · Vitória — aceitar ampliação de grade Otamérica como mitigação tática

DECISÃO PENDENTE

Única alavanca acessível enquanto Atlântica e SPE não maduram · ES = prioritária no Plano de Expansão (projeção de demanda)

Oferta na mesa — Otamérica

Ampliação de grade: 315 → 390 m³/dia (+75 m³/dia · +2.250 m³/mês)

Custo: R\$ 110 k/mês (+R\$15/m³) = R\$ 1,32 MM/ano

Negociação concluída · falta apenas decisão interna ALE.

O que a oferta resolve

- Cobre a média de demanda 2026 com folga (gap médio passa de -8 para +67 m³/dia)
- Reduz dependência da grade pública para operação típica
- Substitui dependência de favor por dependência contratual — ganho de previsibilidade
- Cobertura adequada até aproximadamente 2028

O que a oferta não resolve

- Picos de demanda continuam estourando a grade
- Gap estrutural em 2030 (demanda média 340 vs grade 390 — pico esperado ~680)
- Mantém a ALE em posição cativa com operador único até 2029
- Solução estrutural depende de Atlântica e SPE — ambas em holding

Recomendação: aceitar a oferta. Mitigação tática que destrava a operação 2026-2028 enquanto Atlântica e SPE evoluem como solução estrutural. R\$1,32MM/ano é prêmio razoável pela previsibilidade contratual em praça prioritária com a maior margem do Plano de Expansão (R\$243/m³).

Frentes mantidas no radar — sem evolução material no período

Discussões preservadas, condicionadas a movimentos das contrapartes

EM HOLDING

POOL DE PAULÍNIA — duas frentes paralelas

1. Re-rateio do Pool ferroviário (Proposta 1)

Discussão sem evolução. As outras condôminas não demonstraram interesse em avançar pelo critério de movimentação histórica. ALE segue com esse interesse — sem reação favorável.

2. Formação de pool com base rodoviária IPP (Proposta 2)

Em holding. Ipiranga declinou da negociação no momento. ALE mantém interesse na tese estrutural, mas sem contraparte engajada não há como avançar.

Próximo passo: monitorar movimentos das condôminas e da IPP · sem ação ofensiva no curto prazo.

SJRP — POOL DE 3

IPP condicionou a Guarulhos

Ipiranga vinculou avanço de SJRP à formação de pool em Guarulhos. ALE não aceita: tamanhos e relevâncias muito desiguais.

VITÓRIA — ATLÂNTICA

Sem avanço

Sondagem com dono permanece em estágio informal. Sem NDA. Dependência: interesse efetivo do dono em vender.

SÃO LUÍS — TEMAPE

Sem avanço

Sondagem informal. ALE prioriza não comprometer o BID Granel recém-fechado em São Luís.

Síntese da movimentação desde a última reunião

Visão consolidada do que mexeu, do que parou e do que entrou

12

Projetos evoluíram

Frentes que avançaram materialmente: Phase Outs Rio Grande, Uberaba e Bahia, Goiânia-Nexta, Açailândia/LEM, Caxias/EFEN, Belém+Cubatão+Betim, OPASC Biguaçu, Vitória SPE, Chapecó-Maxissul, renovação São Luís com Granel e proposta Pecém-DISLUB recebida.

5

Projetos novos no período

Frentes que surgiram desde a última reunião: saída Torrão → migração OPLA, Itajaí com Grupo Ávila e revisão do caso Stang, Santa Maria — phase-in com Rede SIM, renegociação de grade em Vitória com Otamérica, e renovação Suape com Ultracargo.

4

Em holding / sem mudança

Frentes mantidas no radar sem evolução material — Pool Paulínia (2 frentes), SJRP e Vitória Atlântica.

Plano avança em ritmo equilibrado — execução das frentes com contraparte definida, paciência nas frentes em holding, e cinco novas oportunidades capturadas no período. Nenhuma frente em situação de risco material.

Próximos passos — marcos das próximas 6 a 8 semanas

O que precisa avançar até a próxima reunião

Açailândia / LEM	Conclusão da escrituração do terreno · protocolo ANP
Caxias / EFEN	Fechamento do contrato comercial · protocolo CADE
Belém + Cubatão + Betim	Conclusão das minutas e assinatura dos contratos
Goiânia – Nexta	Estruturação do modelo de negócio · abertura de tratativa com locador
Phase Out Uberaba	Conclusão da migração de carteira para Uberlândia
OPASC Biguaçu	Validação das minutas com novo cenário de bombeio
Pecém — DISLUB	Iniciar avaliação de viabilidade (alternativa a Fortaleza e suprimento Ipojuca/Cabedelo)
Saída Torrão → OPLA	Avanço no BID · solução-ponte para Gas A no curto prazo
Itajaí — Grupo Ávila	Agenda das engenharias na 1ª quinzena de junho
Itajaí — Stang	Aprovar 406 m³ como referência de planejamento · monitoramento jurídico trimestral
Santa Maria — Rede SIM	Conclusão da avaliação comercial
Vitória — Otamérica	Aceite da ampliação de grade (315 → 390 m³/dia · R\$110k/mês)
São Luís — Granel (renovação)	Aprovação do Conselho · fechamento combo SL + PN + Teresina
Suape — Ultracargo (renovação)	Aprovação do Conselho · fechamento Opção 1 (ToP fixo R\$65)
Phase Out Bahia	Conclusão da análise de impacto · decisão Jequié × Itabuna

Outras frentes monitoradas — situações em acompanhamento, sem decisão ou status neste update

Painel de monitoramento ativo · cinco frentes regionais em análise ou observação

MONITORAMENTO				
CRATO · CE	MACEIÓ · AL	UBERLÂNDIA · MG	VÁRZEA GRANDE · MT	GUAMARÉ · RN
Análise de viabilidade Entrada de S10 melhora o mix da região. Análise de viabilidade da filial iniciada para definição de phase-out ou manutenção da operação.	Análise de viabilidade Análise de viabilidade da filial em curso.	RUMOS — negociação em curso Negociação com RUMOS em curso como alternativa de abastecimento da região.	Cuiabá — base hibernada Base ainda hibernada. Mantida para cumprir exigência legal do MT (tancagem própria comprovada de 750 m³ para operar no estado).	Observação pós-Pecém Monitorar situação após a entrada do Pecém. Possível reconfiguração da matriz de suprimento NE com o novo terminal operacional.

Frentes acompanhadas pela área sem demanda de decisão imediata. Próximo update reportará evoluções materiais.

Obrigado!



PostosALE



ALEcombustiveis



ALEcombustiveis



ALEcombustiveis



ALEcombustiveis

www.ale.com.br
